



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



www.komuna-klina.org

KOMUNA KLINË
ZYRA E PROKURIMIT
KLINË, 08.01.2019

RAPORT VJETOR I PUNES SE ZYRES SE PROKURIMIT PER VITIN 2018

Zyra e prokurimit e themeluar ne baze te LPP dhe Organogramit te Komunes , punen e vete e kryen bazuar ne LPP 04/L-042 I ndryshuar dhe amandamentuar me ligjet 04/L-237 ate nr.05/L-68 dhe 05/L-092 si Udhezuesit dhe rregullores per Prokurim Publik , Ligjin mbi menagjimin e Financave publike dhe Ligjeve qe kane te bejne me qeshtje administrative dhe Bazuar ne Planin e punes se zyres se prokurimit te miratuar ne asamblen komunale per vitin 2018 , jepe kete Raport.

Zyreja ne afatin ligjor ka bere planifikimin e PP dhe ne baze te kerkesave nga Njesite Kerkuese ka pergaditur dhe postuar ne system E-Prokurim te gjitha kerkesat sipas Udhezimit Administrativ nga KRPP (qe kete vite aplikohet per ndryshim nga Vitet e mepareshme).

Ne baze te kerkesave te Njesise kerkuese jane filluar edhe procedurat e prokurimit per vitin 2018.



Gjate ketij viti kemi te filluara 123 procedura tenderimi qe jane bazuar ne vlerat e kontrtave Jane lidhur 120 kontrta dhe 22 Aneks Kontrta ne vlere te Pergjitheshme monetare ne vlere 3.740.126.00 € .

Ne poces pa u perfunduar jane edhe kater procedura qe Konform afateve Ligjore jane ne proces kontraktimi .
Keto jane :

1. Mirembajtja Higjenike dhe sigurimi i Objekteve
2. Harimi i Projekteve zbatuese per Rruge , trotuare dhe Ura
3. Furnzim me dru per ngrohje
4. Furnzim me Aparat Gjeodezik - GJPS

Ne bze te Llojit te procedurave jane keto lloje :

1. Furnzime , 47 procedura ne vlere 413.217.74 € apo 11.05%
2. Sherbime , 33 procedura ne vlere 296.300.13 € apo 7.92 %
3. Pune , 43 Procudura ne vlere 3.030.608.00€ apo 81.03 %




Grafikoni nr. 1 – Llojet e Prokurimeve

Dhe shprehur ne llojet e kontratve sipas vlerave kemi kete gjendje :

1. Kontrata me vlere minimale (me pake se 1000, euro) 29 procedura apo ne vlere 18.863.72€ apo 0.01%
2. Kontrata me vlere te vogel (me pak se 10.000.00 euro) 29 procedura apo ne vlere prej 345.198.00 € apo 9.23 % ,

3. Kontrata me vlere te Mesme (mbi 10.000.00€), 65 procedura ne vlere 3.376.064.00 € apo 90.76 %.

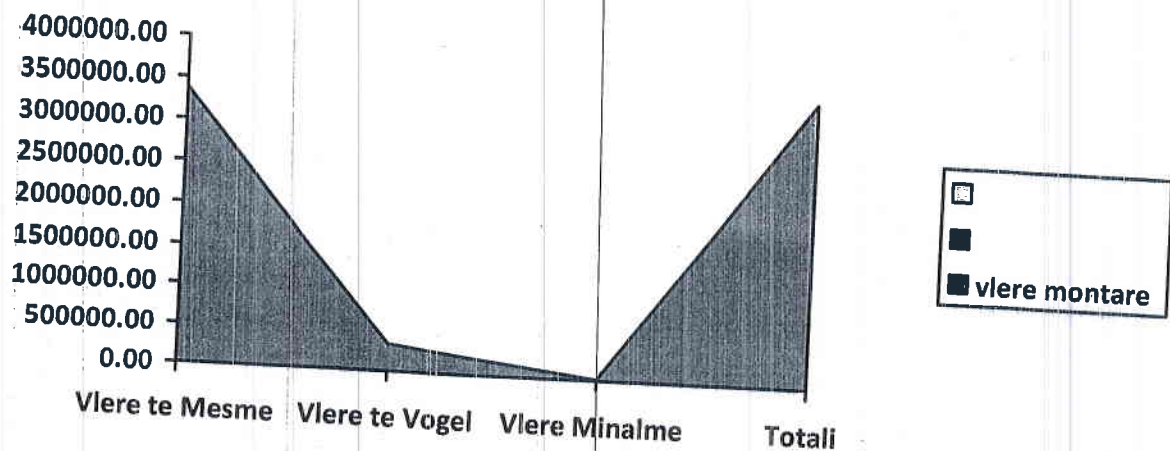

Grafikoni nr. 2. Ne baze te Vleres se Kontrates

Vlene te potencohet dhe duhet te jete shqetesim se gjate vitit 2018 jane procduar 22 procedura per pune shtese qe jane kerkuar nga Menxherete kontratve qe ne te ardhemen duhet shikuar qe keto te minimizohen dhe te pergaditen mire projektet para se te fillohet me procedura prokurimi , Vlera e Ketyre puneve shtese eshet 238.956.60 € apo shprehur ne perqindje eshte 6.39 % e vleres se teresishe te Kontrave te neneshkruara .

Shqetesim tjeter i rendesise se Veqant jane edhe Vonesat ne realizm te puneve ne projektet e kontraktuara dhe ne baze te kesaj kemi edhe vonesa ne Permbushjen e pagesave nga Buxheti i Planifikuar i vitit 2018.

Pos shkresave (jo te shumta) ndaj O.E . te papergjegjshem nuk eshte marr ndonje mase adekuade qe prcakton Ligji per Vonesat .Kjo eshte neglizhence e Menaxhereve te Kontratve qe na lejne pa Marrje te ndonje mase perkates.

Kerkoj nga ZKA dhe Menaxheret e Kontratve qe te Minimizohen Punet shtese te percillen ne detaje vonesat dhe marrja e masave pe O.E te papergjegjshem dhe Konform LPP.

Ne vitin qe lam pase kemi pasur ankesa nga O.E , te paknaqur ne vendimet e A.K.

Ne fazen e pare : Kerkese per rishqyrtim 17 .

Prej tyre te gjitha jane shqyrtuar nga Zyra e prokurimit . Jane shqyrtuar dhe ju eshte kethyer Vendim Negativ konform Nenit 108/A e LPP
12 prej tyre jane mbyllur ne kete faze derisa 6 Ankesa jane derguar ne OSHP te cilat me vendime jane kethyer ne Ri-Vleresim.
Qe jane :

- 1.Furnzim me materjal te Shtypur Zyrtar.
- 2.Furnzim me paisje T.I.
- 3.Sigurimi dhe mirembajtja e Objekteve
- 4.Hartimi i Projekteve per rruge , trotuae dhe ura
- 5.Furnzim me Dru per Ngrohje
- 6.Furnizm me GPS

Gjate Kesaj periudhe jane mbajtur takime me Operatoret Ekonomik te cilet kane kontrta te paperfunduara nga Vitit 2017.
Ne keto takime ku prezentoj edhe Kryetari dhe Menaxheret e kontratave u informuan O.E qe projektet te perfundojne ne afatin e dhene nga – Ri programim i Planeve dinamike dhe u kerkua nga Ta qe asesi te tejkalohen keto plne dhe te jene ne cilesi te kontrates .

Ne kete vite kemi pasur 12 kerkesa per qasje ne Dokumente zyrtare .

Te gjithave kane marr pergjigje me kohe konform Ligjit per qasje ne dokumente zyrtare .

Zyra e prokurimit Bene dhe Urdherblerjeqt qe jane pjese e Pagesave ndaj O.E. ,para se te behet pagese nga Njesia Shpenzuese dhe Zyra e Thesarit te Komunes .Ne kete vite jane proceduar 1.586 Urdherblerje apo Procedim per pages ne vlere te teresishme prej 3.126.337.49 €

Kerkoj nga Drejtori qe te angazhohet ne sa ka mundesi qe te behet kompletim i stafit per kete dikaster meq eshte nevojte imediate .Qe jane percjell edhe ne nga Viti 1999

Raportit i bashkangjesim edhe Tabelen e Kontrave te neneshkruara publike
ne vitin 2018
Tabelen e projekteve ne vitin 2018

Abaz Foniqi , Udheheqes i Zyres se Prokurimit

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop at the beginning and a small flourish at the end.

KOMUNA KLINE

RAPORTI VJETOR PËR KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

Komuna e Kline, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut

VITE TËRKËT 2018

Data e përmirësimit
31.12.2018

PËLËSA I - IDENTIFIKIMI I AUTORITETIT KONTRAKTUES

Emri zyrtar i Autoritetit Kontraktues	
Lloji i Autoritetit Kontraktues (njëdhjetë njerëz)	
Kodi buxhetor	Qeveritar
Adresa	KLINE
Kodi postar - Qytet	32000
Tel./faks/ Çelësi/ Faks	038-206-43-715
Emri i rrethësimit të prokurimit	ABAZ FONIQI
Emri i adresës	abaz.foniqi@kls.gov.mk
Adresa e webit të AK	komuna-kline.org

PËLËSA II - KONTRATAT E NËNSHKRUARA PUBLIKE

Lloji i Buxhetit		TABELA E NËNSHKRIMIT TË KONTRATËS PUBLIKE																				
		Nr. i Prokurimit																				
Të Hyra Vetanake (1) ose Buxh. i Kons. i Kosovës (2) ose		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		Numri rendor i prokurimit	Lloji i prokurimit	Vlera e prokurimit	Procedura e prokurimit	Klasifikimi (2 shifra të para të PPP)	Titulli i aktivitetit të prokurimit	Data e inicimit të aktivitetit të prokurimit	Data e publikimit të njoftimit për kontratë	Data e publikimit të njoftimit për dhënie të kontratës	Data e nënshkrimit të kontratës (në rast anulimi data e njoftimit për anulim)	Afati për implementimin e kontratës (shkruaj datën e fillimit dhe të përfundimit)	Data e përfundimit të kontratës (data e pranimit të përkohshëm/preliminar)	Vlera e parashikuar e kontratës	Çmimi i kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.	Çmimi i Aneks kontratës, duke përfshirë të gjitha taksat etj.	Zbritjet nga kontrata për shkak të ndalesave	Çmimi total i paguar për kontratën	Emri i OE të cilit i është dhënë kontrata	OE vendor (1) ; Jo vendor (2)	Numri i kërkesave për DT dhe numri i ofertave të dorëzuara	Numri i ofertave të ratuara
1	001	1	3	6	36	FURNIZIM ME INVENTAR PER ZYRE TE KABINETIT TE KRYETARIT																
1	002	2	2	1	74	PROJEKTI ZBATUES PER RRUGE TROTUARA DHE URA	04.01.2018	09.01.2018	23.01.2018	02.02.2018	08.02.2018	09.02.2018	€ 5,000.00	€ 2,619.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	2,609.00	ELIONI DRENAS	1	37	2
1	002	2	2	1	74	PROJEKTI ZBATUES PER UJESHELLES KANALIZIME	24.01.2018	29.01.2018	12.03.2018	20.03.2018	20.03.2019	20.12.2018	€ 20,000.00	€ 6,354.00	€ 1,906.00	€ 0.00	€ 0.00	8,260.00	ART PROJECT KLINE	1	75	0
1	002	2	2	1	74	PROJEKTI ZBATUES PER KANALE TE UJIT DHE HAPSRAVE PUBLIKE	24.01.2018	29.01.2018	12.03.2018	20.03.2018	20.03.2019	20.12.2018	€ 15,000.00	€ 3,350.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	3,461.17	HIDRO ING PRISHTINE	1	75	0
1	003	5	2	1	45	NDERTIMI I KANALIT PER UJITJE GARBANICE-ZAM FAZA DYTE	01.02.2018	02.02.2018	18.05.2018	28.05.2018	27.07.2018	23.08.2018	€ 30,000.00	€ 24,415.60	€ 0.00	€ 0.00	€ 746.52	23,668.48	KALLUDRA TRANS -KLINE	1	36	9
1	004	5	2	1	45	MEREMBATJA VEKORE E RRUGET ME ASFALT	07.02.2018	12.02.2018	28.03.2018	06.04.2018	05.04.2019	20.12.2018	€ 40,000.00	€ 35,872.00	€ 8,873.40	€ 0.00	€ 0.00	43,786.56	ISA DEKOR MITROVICE	1	34	4

1	004	5	2	1	45	MIREMBALIA VERORE E RREGULLIOT I RRUGET PA ASFALT	07.02.2018	12.02.2018	28.03.2018	06.04.2018	05.04.2019	20.12.2018	€ 60,000.00	36,462.00	€ 9,132.08	€ 0.00	48,594.08	MIRKOSHA COMPANY	1	34	4	
1	005	2	4	7	36	PUNIMI I REKLAMAVE NDRITJESE NE HYRIE TE KOMUNES DHE SHITJE TE KULTURES	09.02.2018	SKA	SKA	SKA	12.02.2018	16.02.2018	20.02.2018	€ 800.00	€ 820.00	€ 0.00	€ 0.00	820.00	AS DESIGNE STUDIO - KLINE	1	3	3
1	006	1	2	1	30	FURNIZIM ME PAISIE T.I. -MONTENDER ME SHUME OPERATOR	12.02.2018	20.02.2018	20.03.2018	01.04.2018	01.04.2021	20.05.2018	€ 70,000.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	0.00	PARAKULIPI KUAR	1	64	1	
1	007	1	2	1	36	FURNIZIM ME INVENTAR -BANKA DHE KARRIKA	15.02.2018	19.02.2018	07.05.2018	21.05.2018	20.05.2021		€ 50,000.00	27,480.00	€ 0.00	€ 0.00	22,762.00	MOBELAND SUHAREKE	1	23	4	
1	008	2	4	7		TRANSPORT I GRAFE PER SHQIPERI PER FESTEN E TETE MARSIT	15.02.2018	SKA	SKA	07.03.2018	11.03.2018	12.03.2018	€ 500.00	€ 495.00	€ 0.00	€ 0.00	495.00	FLORIMI TOURS KLINE	1	3	3	
1	009	1	2	1		FURNIZIM ME MATERIAL TE SHITPUR ZYRTAR	15.02.2018	19.02.2018		20.06.2018	19.06.2021		€ 15,000.00	€ 3,976.00	€ 0.00	€ 0.00	0.00	AGIMI DE - IDOAN	1	12	4	
1	010	5	2	1	45	ASFALTIMI I RRUGES POGRAGJE	15.02.2018	19.02.2018	27.03.2018	06.04.2018	20.08.2018	30.08.2018	€ 120,000.00	99,635.69	€ 0.00	€ 0.00	99,635.69	BENTA COMPANY KLINE	1	30	5	
1	011	5	2	1	45	NDERITI MI I KANALIZIMEVE - LOT 1- KANALIZIMI ZILAKUQAN-PATAQAN	15.02.2018	19.02.2018	27.03.2018	10.04.2018	09.05.2018		€ 50,000.00	58,255.84	€ 5,490.40	€ 0.00	63,746.20	ALITCOM KLINE	1	34	5	
1	012	1	2	1	36	NDERITI MI I KANALIZIMEVE - LOT 12- KANALIZIMI DUSHI SVERKES	15.02.2018	19.02.2018	27.03.2018	10.04.2018	20.05.2018	31.08.2018	€ 60,000.00	€ 42,668.11	€ 0.00	€ 0.00	42,668.11	INSTRUKTION PEJE	1	34	5	
1	013	2	2	1		FURNIZIM ME PAISIE T.I. -MONTENDER NR.11	26.02.2018	SKA	12.03.2018	20.03.2018	18.04.2018	06.04.2018	€ 15,000.00	€ 10,539.00	€ 0.00	€ 0.00	10,210.90	TRIO TEK PRISHINE	1	4	3	
1	014	2	3	6	71	INSTALIM - MIREMBALIE E RRIJETIT TE NDRITJESE PUBLIKE	27.02.2018	05.03.2018	17.04.2018	27.04.2018	26.04.2019		€ 20,000.00	€ 48,428.34	€ 1,871.66	€ 0.00	20,000.00	ELEKTRIKU KLINE	1	27	4	
1	015	1	4	7		PROJEKTI ZBATUES PER RREGULLIMIN E SHTRATIT DRINI BARDHE	06.03.2018	12.03.2018	30.03.2018	16.04.2018	27.04.2018		€ 6,000.00	€ 1,876.20	€ 0.00	€ 0.00	1,876.20	STUDIO HPSIRA PRISHINE	1	22	5	
1	016	1	2	1		FURNIZIM ME ORE DORE PER TE PENSIONIARTI NE DKA	06.03.2018	SKA	07.03.2018	07.03.2018	07.03.2018	07.03.2018	€ 999.00	€ 1,000.00	€ 0.00	€ 0.00	1,000.00	LIPA KLINE	1	3	3	
1	017	1	3	6	36	FURNIZIM ME UJE DHE PUE FRESKUESE	08.03.2018	09.03.2018	10.04.2018	20.04.2018	36 mngj		€ 10,000.00	€ 1,492.70	€ 0.00	€ 0.00	1,500.95	BURIMI PRISHINE	1	14	1	
1	018	5	3	6		FURNIZIM ME LODRA DHE MATERIAL TE NEVOJESHEM PER QENDRE	13.04.2018	16.04.2018	23.05.2018	12.06.2018	22.06.2018		€ 4,000.00	€ 3,961.26	€ 0.00	€ 0.00	3,960.26	VLORA PRISHINE	1	13	2	
1	019	5	2	1	45	FURNIZIM ME GPS - RITENDER	27.06.2017	19.03.2018	20.03.2018	15.05.2018	21.05.2018	28.06.2018	€ 13,000.00	€ 5,198.60	€ 0.00	€ 0.00	5,198.60	DVH KOSOVA PRISHINE	1	8	3	
1	020	5	2	1	45	MONTIMI I RAMIT NDARES NE QENDREN ZEJTARE NE NOTRA	30.03.2018	19.04.2018	14.05.2018	14.05.2018	20.05.2018	20.05.2018	€ 1,500.00	€ 1,099.00	€ 0.00	€ 0.00	1,099.00	IDEOR CONSTRUCTI ON PRISHINE	1	15	3	
1	021	5	2	1	45	ASFALTIMI I RRUGES PROJEVE -SFERKE	12.04.2018	16.04.2018	04.07.2018	18.07.2018	17.11.2018		499,999.99	€ 311,676.30	€ 30,942.20	€ 0.00	300,000.00	MIRUSHA COMPANY	1	45	11	
1	022	5	2	1	45	ASFALTIMI I RRUGES POTERO I EPERIM	12.04.2018	23.04.2018	19.06.2018	02.07.2018	01.11.2018		€ 400,000.00	€ 258,804.04	€ 25,379.20	€ 0.00	217,898.80	MIRUSHA COMPANY	1	35	7	
1	023	2	4	7	30	ASFALTIMI I RRUGES DHE INFRASTRUKTURES NE KRUSHEVE E MADHE	12.04.2018	14.05.2018	04.09.2018	14.09.2018	13.12.2018		€ 450,000.00	€ 272,444.97	€ 0.00	€ 0.00	200,000.00	BENTA & ALTICOM	1	31	7	
1	024	2	4	7	36	RENOVIMI DYSHEMIVE DHE NDRIMI I DYERVE NE SHKOLLA	13.04.2018	16.04.2018	01.06.2018	08.06.2018	08.07.2018	17.09.2018	€ 34,000.00	€ 14,884.05	€ 1,464.05	€ 0.00	16,348.10	SHOQIPRONI KLINE	1	20	7	
1	025	2	4	7	30	SHERBIME TRANSPORTI I PUNETOREVE KLINE ULQIN DHE ANASJELTAS PER FESTE TE NIE MAJIT	18.04.2017	SKA	SKA	23.04.2018	04.05.2018	04.05.2018	€ 999.00	€ 999.00	€ 0.00	€ 0.00	999.00	FLORIMI TOURS KLINE	1	3	3	
1	026	2	4	7	30	SHITJA E REVISTES SE GJIMNAZIT	17.04.2018	SKA	SKA	20.04.2018	27.04.2018	27.04.2018	€ 400.00	€ 348.00	€ 0.00	€ 0.00	348.00	ERPO PRINT GJAKOVE	1	3	0	

025	5	2	1	45	ASFALTIM I RRUGES DHE KANALIZIMI NE JELLOVC, LOT 1 RRUGA	18.04.2018	06.07.2018	31.07.2018	22.08.2018	12.11.2018	€ 105,000.00	€ 89,913.32	€ 0.00	€ 0.00	80,921,900	BENTA COMPANY	1	25
025	5	2	1	45	ASFALTIM I RRUGES DHE KANALIZIMI NE JELLOVC, LOT 2 KANALIZIMI	18.04.2018	06.07.2018	31.07.2018	23.08.2018	13.11.2018	€ 59,284.80	€ 77,589.30	€ 0.00	€ 0.00	57,000,000	ELI ELZ SHPK	1	25
026	5	2	1	45	RENOVIMI I KANALIZIMIT NE GJERGJEVIK TE MADHE	24.04.2018	25.04.2018	19.06.2018	02.07.2018	01.09.2018	€ 60,000.00	€ 44,159.52	€ 0.00	€ 0.00	44,159.52	KLINIC	1	25
027	5	2	1	45	RENOVIMI I OBJEKTIT TE KOMUNES LT 1 KULMI	24.04.2018	08.06.2018	13.08.2018	17.08.2018	01.10.2018	€ 30,000.00	€ 19,940.48	€ 0.00	€ 0.00	19,940.48	KLINIC	1	29
027	5	2	1	45	RENOVIMI I OBJEKTIT TE KOMUNES LOT 1 DYSHEMEJA FASADIMI	24.04.2018	08.06.2018	13.08.2018	17.08.2018	10.10.2018	€ 30,000.00	€ 17,328.74	€ 1,405.85	€ 0.00	17,328.74	ISA DEKOR	1	44
028	1	3	6	17	INSPEKTOR DHE PUNETORET E SIGURIMIT TE OBJEKTIT PUNE SHITES NE ASFALTIMIN E RRUGES NE LAHET HALITA & BULLAKET JASHANICE	24.04.2018	SKA	25.04.2018	27.04.2018	31.05.2018	€ 0.00	€ 0.00	€ 7,159.58	€ 0.00	7,159.58	GEANTICOM SKENDERAJ	1	13
030	1	3	6	6	FURNIZIM ME SHULTA TE NGROHTA PER MUISARE TE FESTIVALIT I KENDOME AKOMODIMI I MUSAFIREVE PER FESTIVALIN I KENDOM LIRISE 2018	18.04.2018	27.04.2018	21.05.2018	01.06.2018	08.06.2018	€ 3,500.00	€ 2,086.00	€ 542.36	€ 0.00	2,628.36	PIZZA FRESH	1	10
032	2	3	6	6	MARJE NE SHFYTEZIN E KARREKAVE PER FESTIVALIN I KENDOME LIRISE 2018	18.04.2018	27.04.2018	18.05.2018	04.06.2018	08.06.2018	€ 2,500.00	€ 2,400.00	€ 0.00	€ 0.00	2,400.00	MOTEL DRINI	1	4
033	1	4	7	45	FURNIZIM ME KOSA PER SHKOLLA	26.04.2018	SKA	SKA	18.05.2018	30.05.2018	€ 990.00	€ 880.00	€ 0.00	€ 0.00	720.00	ENISI KLINE	1	5
034	5	2	1	45	ASFALTIM I RRUGES DRENOVC	07.05.2018	07.05.2018	19.06.2018	10.07.2018	27.09.2018	€ 66,000.00	€ 47,089.03	€ 4,653.87	€ 0.00	50,000.00	BUJAR ELECTRONIKS	1	3
035	2	3	6	45	PUNIMI I SKENOGRAFISE DHE BINES, NDRIQIMI PER FESTIVALIN I KENDOME LIRISE 2018	04.05.2018	07.05.2018	23.05.2018	28.05.2018	05.06.2018	€ 5,000.00	€ 1,798.00	€ 0.00	€ 0.00	1,928.00	PELE	1	23
036	2	3	6	6	SHERBIME ZERIMI PER FESTIVALIN I KENDOME LIRISE 2018	18.04.2018	04.05.2018	22.05.2018	31.05.2018	08.06.2018	€ 2,000.00	€ 1,798.00	€ 0.00	€ 0.00	1,798.00	STUDIO KLINE	1	13
037	1	3	6	30	FURNIZIM ME MATERIAL DEKORIM, FTESA MIRENDIME BILBORDA MACA LIRISE 2018	18.04.2018	10.05.2018	24.05.2018	04.06.2018	08.06.2018	€ 2,000.00	€ 1,978.46	€ 0.00	€ 0.00	1,978.46	STUDIO PRO SD	1	5
038	1	2	1	1	FURNIZI ME NGJYRA DHE KARTIRIXHE PER SHTYPE	18.04.2018	10.05.2018	24.05.2018	04.06.2018	08.06.2018	€ 30,000.00	€ 8,851.20	€ 0.00	€ 0.00	6,898.60	OFFICE PRINTY	1	10
039	1	2	1	30	FURNIZIM ME VAJRA DHE LUBRIKANTE PER AUTOMODETE ZYTARE	16.05.2018	02.07.2018	04.09.2018	10.09.2018	10.09.2021	€ 10,000.00	€ 9,218.16	€ 0.00	€ 0.00	0.00	EUROPRINTY F	1	13
040	1	2	1	36	mini tender nr. 1 FURNIZIM ME PAISJE T.L	20.04.2018	SKA	14.12.2018	27.12.2018	10.02.2019	€ 24,000.00	€ 38,764.00	€ 0.00	€ 0.00	0.00	PEIROL FERIZAJ	1	13
041	2	2	1	93	MIREMBALTIM E RREJETT TE KANALIZIMEVE	16.05.2018	27.06.2018	16.07.2018	26.07.2018	25.07.2019	€ 20,000.00	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 0.00	20,000.00	MIRUSHA COMPANY	1	11
042	5	2	1	45	ASFALTIM I RRUGES BOKSHQ - LAGIA FALIAJ	17.05.2018	18.05.2018	16.07.2018	24.07.2018	15.09.2017	€ 70,000.00	€ 38,932.34	€ 2,273.10	€ 0.00	41,215.21	INNT AM	1	16
043	5	2	1	45	NDERTIMI I RRETHROTULLIMIT NE SHESHIN NDUE PER LESH	18.05.2018	19.05.2018	13.06.2018	26.06.2018	11.07.2018	€ 40,000.00	€ 41,817.01	€ 4,004.91	€ 0.00	45,821.92	MIRUSHA KLINE	1	21
044	5	2	1	45	NDERTIMI I KANALIZIMIT NE ZAM	24.05.2018	28.05.2018	17.07.2018	30.07.2018	30.10.2018	€ 50,000.00	€ 37,654.13	€ 0.00	€ 0.00	24,999.99	COMPANY KLINE	1	2
045	5	2	1	45	RREGULLIMI I VORRESAVE TE DESHMOREVE S	21.05.2018	25.05.2018	25.06.2018	16.07.2018	15.09.2017	€ 50,000.00	€ 23,661.66	€ 0.00	€ 0.00	2,628.58	INN VALA PEJE	1	20
046	5	2	1	45	ASFALTIM I RRUGES VOLLAJ-QUEPEVE E LARTE	24.05.2018	31.05.2018	13.07.2018	24.07.2017	02.10.2018	€ 178,000.00	€ 123,254.02	€ 2,331.06	€ 0.00	104,734.84	AIM SHPK	1	26
047	1	4	7	36	FURNIZIM ME MATERIAL PER PANARIN PRODHIME BUQESORE 2018	23.05.2018	SKA	SKA	01.06.2018	05.06.2018	€ 990.00	€ 971.00	€ 0.00	€ 0.00	971.00	AS DESIGNE STUDIO	1	3

048	5	2	1	45	RENOVIMI I EMERGENCENES DHE CYBERJE E HPSIRAVE TE OKAF	31.05.2018	04.06.2018	06.08.2018	01.08.2018	10.09.2018	€ 30,000.00	€ 22,068.35	€ 0.00	€ 0.00	22,070.00	TOSI V PEJE	1	23
049	5	2	1	45	RRIQA RADULLOVC	30.05.2018	04.06.2018	16.07.2018	26.07.2018	19.09.2018	€ 50,000.00	€ 44,752.28	€ 0.00	€ 0.00	20,000.00	NNIT AIM	1	23
050	5	2	1	45	RENOVIMI I ZYRES SE OFIOARISE GILLARVE	30.05.2018	04.06.2018	16.07.2018	26.07.2018	08.10.2018	€ 20,000.00	€ 18,988.40	€ 0.00	€ 0.00	15,000.00	ELEZAJ	1	23
052	5	3	5	45	PUNE SHITES NE RRUGEN STUP -ZAJM FAZA DYTE	30.05.2018	05.06.2018	18.06.2018	21.06.2018	30.06.2018	€ 0.00	€ 12,718.63	€ 0.00	€ 0.00	12,718.63	TOSI V PEJE	1	23
053	2	2	1	93	SIGURIMI I AUTOMJETEVE	30.05.2018	11.06.2018	07.08.2018	17.08.2018	13.08.2021	€ 13,000.00	€ 18,797.40	€ 0.00	€ 0.00	0.00	JEHONA	1	1
054	1	4	7	30	FURNIZIM ME TERP PER NEVOJA TE FESTIVALIT I KENDOM LIRISE 2018	04.06.2018	SKA	SKA	05.06.2018	06.06.2018	€ 150.00	€ 150.00	€ 0.00	€ 0.00	150.00	DUSHI KLINE	1	3
055	1	4	7		FURNIZIM ME GAZ PER SISTEMIN E ZYRE PRITESE	05.06.2018	SKA	SKA	16.07.2018	20.07.2018	€ 800.00	€ 732.80	€ 0.00	€ 0.00	732.80	ELEKTRIKU KLINE	1	3
056	5	2	1	45	ASFALTIMI I RRUGEVE LOT 1- UDMIR	06.06.2018	11.06.2018	25.07.2017	06.08.2018	05.10.2018	€ 80,000.00	€ 73,193.32	€ 7,217.72	€ 0.00	73,091.71	BURIM MALISHEVE	1	5
057	5	2	1	45	RENOVIMI I SHKOLLES CARAVIK	06.06.2018	11.06.2018	25.07.2018	06.08.2018	05.10.2018	€ 90,000.00	€ 84,266.37	€ 0.00	€ 0.00	49,860.47	NDERTIMI PEJE	1	4
058	5	2	1	45	NDERTIMI I FUSHES DHE RREHOJAVE NE SHKOLLEN KERPZ	12.06.2018	18.06.2018		07.08.2018	08.09.2018	€ 30,000.00	€ 22,231.45	€ 2,500.00	€ 0.00	14,620.00	PRISHINE SHQIPRONI	1	4
059	5	2	1	45	NDERTIMI I FUSHES DHE RREHOJAVE NE SHKOLLEN PERROVE	12.06.2018	22.06.2018	26.07.2018	07.08.2018	08.09.2018	€ 30,000.00	€ 26,744.50	€ 0.00	€ 0.00	26,744.50	SHQIPRONI KLINE	1	4
060	1	3	6		KORPA NE GRABANICE	18.06.2018	20.06.2018	27.07.2018	07.08.2018	06.09.2018	€ 20,000.00	€ 18,787.72	€ 0.00	€ 0.00	16,008.05	KORPA NE GRABANICE	1	4
061	1	4	7		FURNIZIM ME MATERIAL PER PERKUTITIM TE KOLE MIRDIYES	23.05.2018	16.07.2018	29.08.2018	03.09.2018	23.09.2018	€ 6,000.00	€ 4,089.00	€ 0.00	€ 0.00	4,356.40	TECO SHPK PRISHINE	1	29
062	2	4	7		RRREGULLIMI I ULLQEVE NE SHPALLJE DHE PUBLIKIME TE KONKURSEVE EDHE INFORMATIVE	20.06.2018	SKA	SKA	21.06.2018	22.06.2018	€ 999.00	€ 995.00	€ 0.00	€ 0.00	993.00	EDONI KLINE	1	3
063	5	2	1	45	ASFALTIMI I RRUGES NE RASTOKA	22.06.2018	09.07.2018	30.08.2018	10.09.2018	10.11.2018	€ 38,000.00	€ 69,939.38	€ 0.00	€ 0.00	490.60	VILEZERIT HOTI KLINE	1	3
064	2	2	1		SHPALLJE DHE PUBLIKIME TE KONKURSEVE EDHE INFORMATIVE	25.06.2018	27.06.2018	01.08.2018	03.08.2018	02.08.2021	€ 15,000.00	€ 6,500.00	€ 0.00	€ 0.00	2,100.00	SHPERNDARI A EXPRES PRISHINE	1	11
065	1	4	7		FURNIZIM ME MATERIAL PER PERKUTITIM TE KOLE MIRDIYES	27.06.2018	SKA	SKA	07.07.2018	07.07.2018	€ 800.00	€ 625.00	€ 0.00	€ 0.00	625.00	AS STUDIO KLINE	1	3
066	5	2	1	45	RENOVIMI I FUSHES NE FUTBOLLIT NE STADIONI PUNMI I RAMAVE MBROJTES NE ZYREN E OFIOARISE GRABANICE	04.07.2018	09.07.2018	19.07.2018	02.08.2018	12.08.2018	€ 7,000.00	€ 7,718.50	€ 0.00	€ 0.00	7,718.50	MIRUSHA COMPANY KLINE	1	3
067	5	4	7		NDERTIMI I URAVE LOT L UDMIR dhe BIBAJ	04.07.2018	12.07.2018	11.09.2018	17.09.2018	16.11.2018	€ 999.00	€ 513.30	€ 0.00	€ 0.00	513.30	NFT QENDRIMI KLINE	1	3
068	5	2	1	45	NDERTIMI I URAVE LOT 2 SHTARICE	04.07.2018	12.07.2018	11.09.2018	18.09.2018	16.11.2018	€ 48,000.00	€ 29,161.05	€ 0.00	€ 0.00	8,363.01	IR & BGRORUP & BA PRISHINE-SHAREKE	1	28
069	5	3	5	45	PUNE SHITES NE ASFALTIMIN ERUGES JASHANICE	10.07.2018	SKA	SKA	16.07.2018	20.07.2018	€ 20,000.00	€ 14,926.71	€ 0.00	€ 0.00	0.00	ALBAKOS & NDERTIMI PEJE	1	28
070	1	3	6	36	FURNIZIM ME MOTOCIKLA DHE PAJUE PER SHBZ	11.07.2017	18.09.2018	10.10.2018	23.10.2018	30.12.2018	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	€ 0.00	8,320.00	REA SHPK KLINE	1	1
071	1	2	1		FURNIZIM ME BARERA	20.07.2018	13.08.2018	10.09.2018	13.09.2018	12.09.2021	€ 20,000.00	€ 21,999.00	€ 0.00	€ 0.00	0.00	AGANI - PRISHINE	1	11

[illegible]

091	2	3	6	VENDOSJA E LANIT NGA SERVER ROOMI	12.09.2018	17.09.2018	04.10.2018	26.10.2018	31.10.2018	€ 5,000.00	€ 2,356.80	€ 0.00	€ 0.00	2,356.80	2-TECH PRISTINE	1	1	0	
092	5	2	1	45	NDERITIM I KANALIT PER UJTJE LOT 1 KPOZ	12.09.2018	17.09.2018	26.10.2018	12.11.2018	20.12.2018	€ 40,000.00	€ 30,437.00	€ 0.00	€ 0.00	0.00	SHKODRANI KLINE	1	15	
092	5	2	1	45	NDERITIM I KANALIT PER UJTJE LOT 2- RUDIC	12.09.2018	17.09.2018	26.10.2018	09.11.2018	20.12.2018	€ 23,000.00	€ 16,422.58	€ 0.00	€ 0.00	0.00	JETIMRI DRENAS	1	15	
093	1	3	6		FURNIZIM ME PAISJE MIKRORE PER EMERJENCE	14.09.2018	17.09.2018	29.10.2018	01.11.2018	30.11.2018	€ 10,000.00	€ 8,745.00	€ 0.00	€ 0.00	8,745.00	MADE KOS PRISTINE	1	13	
094	1	3	6		FURNIZIM ME VEGJA PUNE PER MIREMBATJE HAPIRAYE PUBLIKE	14.09.2018	17.09.2018	02.10.2018	11.10.2018	10.10.2019	€ 8,200.00	€ 6,956.00	€ 0.00	€ 0.00	3,000.00	NTP BESI KLINE	1	12	
095	1	4	7	30	FURNIZIM ME MONTIMI KLIMAVE ALUMILUESE	15.10.2018	SKA				€ 700.00	€ 680.00	€ 0.00	€ 0.00	680.00	BIJAR KLINE	1	3	
096	1	3	6	36	FURNIZIM ME APARAT DIGITAL - KAMER DIGITAL	05.11.2018	19.11.2018	SKA	12.11.2018	15.11.2018	€ 2,000.00	€ 1,638.30	€ 0.00	€ 0.00	1,638.30	ELECTRONIKS KLINE	1	17	
097	1	3	6		FURNIZIM ME UNIFORMA - RROBA PUNE PER SHIZ	05.09.2018	24.09.2018	23.10.2018	03.12.2018	07.12.2018	20.12.2018	€ 6,000.00	€ 4,860.00	€ 0.00	€ 0.00	4,860.00	UNIKAT PELE PRISTINE	1	9
098	5	2	1	45	NDERITIM I KANALIZIMIT NE RASTOKA	18.09.2018	19.09.2018	22.10.2018	30.11.2018	20.12.2018	€ 40,000.00	€ 36,651.18	€ 0.00	€ 0.00	25,000.00	ELFEZAJ SHPK KLINE	1	11	
099	2	2	1		HARTIMI I PROJEKTEVE ZBATUSE PER RRUGE TROTUARE DHE URA	20.09.2018	24.09.2018	27.12.2018	08.01.2019	08.04.2019	€ 20,000.00	€ 18,297.33	€ 0.00	€ 0.00	0.00	PROING-PART NERS PRISTINE	1	18	
100	1	2	1		FURNIZIM ME APARAT GJEDDEZIK	21.09.2018	25.09.2018	16.11.2018			€ 10,000.00	€ 5,286.40	€ 0.00	€ 0.00	0.00	AGEO & CO PRISTINE	1	3	
101	1	4	7		FURNIZIM ME MATERIAL PER SHENIMIN E PERVISTORIT TE DESHMOREVE TE GLAREVES	20.09.2018	SKA	SKA	25.09.2018	28.09.2018	€ 300.00	€ 299.50	€ 0.00	€ 0.00	299.50	AS DESIGNE STUDIO KLINE	1	3	
102	2	4	7	45	SUVATIM I SHPALETAVE TE DYEREVE DHE DITAREVE NE SHKOLLEN BUDISALC	24.09.2018	SKA	SKA	04.10.2018	20.10.2018	€ 999.00	€ 720.00	€ 0.00	€ 0.00	720.00	NN SHIPRONI KLINE	1	3	
103	1	2	1		FURNIZIM ME BUKJE DHE PRODUKTE BRIMI	04.10.2018	06.10.2018	31.10.2018	14.11.2018	36.11.2018	€ 15,000.00	€ 10,400.00	€ 0.00	€ 0.00	0.00	PASHTRIKU KLINE	1	5	
104	5	3	6	45	PUNE TE PAPAARAPARA NE RENOVIMIN E SHKOLLES CARAVK	03.10.2018	08.10.2018	17.10.2018	26.10.2018	31.10.2018	€ 7,400.00	€ 6,989.61	€ 0.00	€ 0.00	0.00	1 & B GROUP PRISTINE	1	21	
105	5	2	1	45	NDERITIM I KANALIZIMIT UIMIR SHTRICE	04.10.2018	10.10.2018	09.11.2018	19.11.2018	26.12.2018	€ 30,000.00	€ 28,089.50	€ 0.00	€ 0.00	28,089.50	ELFEZAJ KLINE	1	24	
106	5	3	6	45	VENDOSJA E SHTYLLAVE ANTIPARKING NE SHESH	12.10.2018	18.10.2018	07.11.2018	12.11.2018	02.12.2018	€ 9,999.00	€ 7,995.68	€ 0.00	€ 0.00	7,995.68	GER GROUP PRISTINE	1	13	
107	2	2	1	93	MIREMBATJA DIMEORE E RRUGE LOT 1 RRUGET JASHTJE QYTEIT	12.10.2018	19.10.2018	26.11.2018	29.11.2018	30.06.2019	€ 40,000.00	€ 40,000.00	€ 0.00	€ 0.00	10,000.00	MIRUSHA COMPANY	1	16	
107	2	2	1	93	MIREMBATJA DIMEORE E RRUGE LOT 2 RRUGET DHE TROTUARE NE QYTET	12.10.2018	19.10.2018	26.11.2018	29.11.2018	30.06.2018	€ 20,000.00	€ 20,000.00	€ 0.00	€ 0.00	7,364.26	ASPHALT GROUP KLINE	1	16	
108	1	2	1		FURNIZIM ME GOMA	02.10.2018	18.10.2018	26.11.2018	30.11.2018	36.11.2018	€ 30,000.00	€ 18,151.80	€ 0.00	€ 0.00	1,760.12	EURODELTA FUSHE KOSOVE	1	10	
109	1	4	7	30	FURNIZIM ME DITRA PER EMERJENCE	25.10.2018	SKA	SKA	06.11.2018	20.11.2018	€ 999.00	€ 963.00	€ 0.00	€ 0.00	963.00	BIJAR KLINE	1	3	
110	5	2	1	45	ASFALTIMI I RRUGES NE BUDISALC DHE NE DOLICE						€ 52,000.00	€ 51,651.06	€ 3837.60	€ 0.00	55,488.66	MIRUSHA COMPANY	1	17	
111	1	2	1	30	FURNIZIM ME TELEFONA	22.10.2018	25.10.2018	21.11.2018	29.11.2018	20.12.2018	€ 12,000.00	€ 9,216.08	€ 0.00	€ 0.00	8,055.10	ALBUS PRISTINE	1	17	
112	5	2	1	45	NDERITIM I SHTEPEISE PER BANIM SOCIAL	02.11.2018	04.11.2018	30.11.2018	07.12.2018	07.12.2018	€ 15,000.00	€ 14,547.50	€ 0.00	€ 0.00	4,000.00	ISA DEKOR MITROVICE	1	24	
113	2	3	6	93	DEKORIMI I QYTEIT PER FESTA TE FUNDEVITIT	05.11.2018	14.11.2018	30.11.2018	06.12.2018	15.12.2018	€ 9,000.00	€ 8,924.50	€ 0.00	€ 0.00	5,000.00	PRISTINE & MIRUSHA COMPANY	1	6	
114	1	4	7	30	FURNIZIM ME TAVOLINA DHE PERDE PER PUNE SHITES NE ASFALTIMIN ERUGES QUPERVE UIMIR FAZA PARE	01.11.2018	SKA	SKA	19.12.2018	24.12.2018	€ 990.00	€ 980.12	€ 0.00	€ 0.00	0.00	DON SHPK KLINE	1	3	
000	5	3	5	45			SKA	13.11.2018	19.11.2018	20.12.2018	€ 0.00	€ 0.00	€ 621.47	€ 64	0	0.00	MAJLISHEVE COMPANY	1	1

1	115	2	4	7	93	INSTALIM I OPS NE AVANGUJTE TE QANME	05.11.2018	12.11.2018	30.11.2018	10.12.2018	10.12.2019		€ 1,000.00	€ 990.00	€ 922.50	0	698.00	PRISHTINE	1	10
	116	1	4	7	30	FURNIZIM ME MATERIJAL PER FESTA TE FUNDEVITIT	14.11.2018	SKA	SKA	SKA	19.11.2018	25.11.2018	€ 990.00	€ 990.00	€ 922.50	0	922.50	AS DESIGNE STUDIO		
	116	1	4	7		FURNIZIM ME INVERTOR	04.12.2018	SKA	SKA	SKA	09.12.2018	19.12.2018	€ 999.00	€ 998.00	€ 998.00	0	998.00	ELEKTRIKU	1	3
	117	2	2	1		TRANSPORT I NXENESVE TE SHPUJ JASHANICE	12.11.2018	15.11.2018	24.12.2018	08.01.2018	07.01.2022		€ 15,000.00	€ 15,000.00	€ 15,000.00	0	0.00	OLJIMIT KLINE	1	4
	118	1	4	7		FURNIZIME PER GJEODET	14.11.2018	SKA	SKA	05.12.2018	10.12.2018	24.12.2018	€ 999.00	€ 993.00	€ 993.00	0	0.00	ALBERT M KLINE	1	3
	119	2	3	5		BUSTI I SKENDRBEUT	21.11.2018	26.11.2018	07.12.2018	14.12.2018	20.12.2018	24.12.2018	€ 990.00	€ 984.00	€ 984.00	0	0.00	ART MERISI MITROVICE	1	2
	120	2	4	7	45	RREGULLIMI I OBORRIT NE SHF ISMET RACI	22.11.2018	SKA	SKA	03.12.2018	19.12.2018	24.12.2018	€ 990.00	€ 875.00	€ 875.00	0	0.00	BENITA COMPANY	1	3
	121	1	2	1	30	FURNIZIM ME DIGJITILIZATOR DHE PAISJE TIERA PER RADIOLOGJI	22.11.2018	26.11.2018	12.12.2017	14.12.2018	25.12.2018	24.12.2018	€ 15,000.00	€ 14,750.00	€ 14,750.00	0	14,750.00	KOSOVA MED HEALTHCARE PRISHTINE	1	9
	122	1	4	7		FURNIZIM ME KOSTUME MASKOTA PER OERDHE	22.11.2018	SKA	SKA	18.12.2018	21.12.2018	26.12.2018	€ 250.00	€ 210.00	€ 210.00	0	0.00	DRINI COMERC	1	3
	123	2	4	7		TRANSPORT I NXENESVE NE PROJEKTIN SAVE THE CHILDREN NE PEJE DHE PRIZREN	23.11.2018	SKA	SKA	04.12.2018	19.12.2018	26.12.2018	€ 750.00	€ 749.84	€ 749.84	0	0.00	FLORINDI TOURS KLINE	1	3
TOTALI (15+16-17) :													€ 4391,487.4	€ 3,501,917.1	€ 3,740,956.6	€ 746.57	3,740,126	2,851,783.36	2,204	468



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIC OF KOSOVO
REPUBLIKA KOSOVO

www.komuna-klina.org

KOMUNA E KLINËS
MUNICIPALITY OF KLINA
OPŠTINA KLINA



Projektet 2018

nr	Projekti	Kostoja	Komuna	Donacion	Donatori	Vrejtje
1	PROJETIMI I PROJETEVE ZBATUSE PER RRUGE URA TROTUARA, UJESJELLES KANALIZIME DHE KAPSIRA PUBLIKE	18.477.00	18.477.00	0		Perfunduar
2	NDERITIMI I KANALIT PER UIJTJE GRABANICE -ZAJM FAZA DYTE	24.415.60	24.415.60	0		Perfunduar
3	MIREMBAJTJA VERORE E RRUGEVE ME ASFALT	43.786.48	43.786.48	0		Perfunduar
4	MIREMBAJTJA VERORE E RRUGEVE PA ASFALT	48.594.08	48.594.08	0		Pwerfunduar
5	ASFALTIMI I RRUGES POGRAGJ	99.635.69	99.635.69	0		Perfunduar
6	NDERITIMI I KANALIZIMIT ZILAKUQAN - PATAQAN	63.746.20	63.746.20	0		Perfunduar
7	NDERITIMI I KANALIZIMIT NE DUSH (S)	42.668, 11	42.668.11	0		Perfunduar
8	MIREMBAJTJA E RRJETIT TE NDRIQIMIT PUBLIK	20.000.00	20.000.00	0		Perfunduar
9	PERGADITJA E PROJEKTT ZBATUES PER RHABILITIM TE SHTRATIT LUMIT DRINI BARDHE	1.876.20	1.876.20	0		Perfunduar
	TOTALI I FAQES	363.199.36	363.199.36	0		Perfunduar

nr	Projekti	Kostoja	Komuna	Donacion	Donatori	Vrejtje
9	FURNIZIM ME GPS					
10	RENOVIMI I DYSHEMVE DHE NDRIMI I DYEREVE NE SHKOLLEN SFERK	5.198.60 14.884.05	5.198.60 14.884.05			Perfunduar
11	ASFALTIMI I RRUGES DHE KANALIZIMIT NE JELLOVC	167.502.62	41.502.62			Perfunduar
12	ASFALTIMI I RRUGES POETERQI E PERM	284.183.24	134.183.24	126.000.00€	MZHR	Realizuar 90%
13	ASFALTIMI I RRUGES PERQEVERE - SFERKE	342.612.50	42.612.50	150.000.00	M.I.	Perfunduar
14	ASFALTIMI I RRUGES DRENOVC	51.742.90	51.742.90	300.000.00€	M.I.	Perfunduar
15	INFRASTRUKTURES NE KRUSHEVE TE MADHE	272.444.97	172.444.97	100.000.00€		Perfunduar
16	NDERITMI I KANALIZIMIT NE GIJRGJEVAK TE MADHE	44.159.52	44.159.52	0	M.I.	Realizuar 90%
17	RENOVIMI I OBJEKTIT TE KOMUNE	37.269.22	7.269.22	30.000.00€	MPL	PERFUNDUAR
18	ASFALTIMI I RRUGES BOKSHIQ - LAGJA FAZLIA	41.215.44	30.365.44	10.850.00€	DEMOS	Perfunduar
19	NDERITMI I RRETHE RROTULLIMIT NE SHESHIN NDUERLESHI	45.821.92	15.821.92	30.000.00€	DEMOS	PERFUNDUAR
20	NDERITMI I KANALIZIMIT NE ZAJM DESHMOREVE	37.654.12	12.654.12	25.000.00	DEMOS	Realizuar 80 %
21	ASFALTIMI I RRUGES VOLLJAK - QUPJEVE E LARTE	125.585.08	125.585.08			Realizuar 90 %
22	RENOVIMI I EMERGJENCES DHE LYERJA E HAPSIHAVE TE OKMF	22.068.95	22.068.95			Perfunduar
23	TOTALI I FAQES	1.516.004.40	744.154.79	771.850.00		Perfunduar

nr	Projekti	Kostoja	Komuna	Donacion	Donatori	Vrejte
24	ASFALTIMI I RRUGES RADULOVÇ	44.752.28	44.752.28			Realizuar 50%
25	UJESJELLSIT RADULOVÇ					
26	RENOVIMI I ZYRES SE OFIQARISE GLAREVE	18.988.40	8.988.40			Realizuar 50%
27	ASFALTIMI I RRUGES UJMI	12.718.63	12.718.63	10.000.00	DEMOS	Realizuar 95 %
28	ASFALTIMI I RRUGES GREMIK	80.411.04	80.265.37			NE REALIZIM
29	RENOVIMI SHKOLLES CARAVIK	84.266.37	84.266.37			Perfunduar
30	NDERITIMI I FUSHES SE SPORTIT DHE RRETHOJAVE NE SHKOLLEN KPUZ	62.257.82	62.257.82			Realizuar 70%
31	NDERITIMI I FUSHES SE SPORTIT DHE RRETHOJAVE NE SHKOLLEN PERQËVE	24.731.45	24.731.45			Realizuar 90 %
32	NDERITIMI I KANALIZIMIT NE LAGJEN KODRA GRÿKA NE GRABANICE	26.744.50	26.744.50			NE REALIZIM
33	MIREMBALITIA E RRJETIT TE KANALIZIMEVE	18.787.72	18.787.72			NE REALIZIM
34	INSTALIMIT KAMERA VE NE SHKOLLA DHE OKMF	20.000.00	20.000.00			Perfunduar
35	ASFALTIMI I RRUGES RASTOKA	4.709.00	4.709.00			Perfunduar
36	RENOVIMI I FUSHES SE FUTBOLLIT NE STADIUM	69.939.38	69.939.38			PERFUNDUAR
37	NDERITIMI I URES UJMI	7.718.50	6.218.50			PERFUNDUAR
38	NDERITIMI I URES SHITARICE	24.056.05	24.056.05			PERFUNDUAR
39	NDERITIMI I URES LAGJEN BIBAJ RANOC	14.926.71	14.926.71			Realizuar 30 %
40	MURATIMI DHE RENOVIME NE SHFIMU JAGOD	5.105.00	5.105.00			Realizuar 0 %
	TOTALITAFQES	6.211.52	6.211.52			PERFUNDUAR
		526.324.37	514.824.37	11.500.00		PERFUNDUAR

nr	Projekti	Kostoja	Komuna	Donacion	Donatori	Vrejte
41	ASFALTIMI I RRUGES GLLAREVE					
42	RIGJEVE E STAPANICE	141.578.60	141.578.60			Realizuar 90%
43	ASFALTIMI I RRUGES SFERKE LUMAJ	57.643.30	57.643.30			Realizuar 90%
44	ASFALTIMI I RRUGES KPUZ-LAGJA LUMAJ	58.846.00	58.846.00			Realizuar 95 %
45	ASFALTIMI I RRUGES KLINAVC-LAGJA DRAGAJ	18.027.55	18.027.55			Realizuar 95 %
46	RENOVIMI I DYSSHEMEVE NE SHKOLLEN SFERK	16.581.60	16.581.60			Perfunduar
47	SHENJIZIMI I RRUGVE ME SHENJA TRAFIKU	12.359,54	12.359.54			NE REALIZM
48	RENOVIMI I GJIMNAZIT -FAZA DYTE	28.921.54	28.921.54			NE REALIZIM
49	ASFALTIMI I 10 RRUGJEVE LOKALE ME BASHKEFINANCIM	105.561.60	82.561.60	23.000.00	KOMUNITETI	Ne realizim
50	ASFALTIMI I RRUGES TE SHKOLLA NE ZAJM DHE LAGJEN PALUCAJ SEGMENTI I NE QYTET	50.958.60	50.928.60			Perfunduar
51	NDERITIMI I KANALIZIMIT NE LAGJEN BUZHALET QABIQ DHE GJURGJEVIK I VOGEL	12.360.30	12.360.30			Perfunduar
52	ASFALTIMI I RRUGES BOKSHIQ - LAGJA GRYKA -KODRA	42.676.00	42.676.00			Realizuar 70%
53	FURNIZIM ME RRE PER NDERITIM TE RRUGES GJURGJEVIK I MADHE DHE MIREMBAJTJE TE RRUGJEVE LOKALE MIREMBAJTJA E HAPSIHAVE PUBLIKE	43.726.56	43.726.56			NE REALIZIM
	TOTALI I FAQES	19.401.20	19.401.20			NE REALIZIM
		608.642.39	585.642.39	23.000.00		

nr	Projekti	Kostoja	Komuna	Donacion	Donatori	Vrejte
54	NDERITIMI I KANALIT TE UJTJES KPUI	30.210.76	30.210.76			NE REALIZIM
55	NDERITIMI I KANALIT TE UJTJES RUDICE	16.422.58	16.422.58			NE REALIZIM
56	NDERITIMI I KANALIZIMIT NE RASTOKA	36.651.18	36.651.18			NE REALIZIM
57	NDERITIMI I KANALIZIMIT NE SHITARICE -UMIR	28.089.50	28.089.50			Realizuar 80 %
58	VENDOSJA E SHFYELAVE ANTIPARKING NE SHESH	7.998.68	7.998.68			Realizuar 80%
59	ASFALTIMI I RRUGES QABIQ	92.238.79	92.238.79			Perfunduar
60	MIREMBATJA DIMERORE E RRUGEVE	60.000.00	60.000.00			Ralizuar 60 %
61	ASFALTIMI I RRUGEVE NE BUDISALC DHE DOLLÇ	55.488.66	45.064.66			NE REALIZIM
62	NDERITIMI I SHTEPISE PER BANIM SOCIAL	14.547.50	4.547.50	10.394.00	QYTETARET	Perfunduar
63	BUSTI I SKENDERBEUT			10.000.00	MPMS	NE REALIZIM
64	DEKORIMI I QYTETIT PER FESTA TE FUNDVITIT	9.840.00	7740.00	2.100.00	KOMUNITETI	NE REALIZIM
65	FURNIZIM ME DIGJITILIZATOR PER RADIOLOGJI	14.750.00	14.750.00	0		Perfunduar
66	HARTIMI I PROJEKTEVE ZBATUESE PER RRUGE TROTUARE DHE URA	18.297.32	18.297.32	0		Perfunduar
	TOTALI I FAQES	394.459.47	371.965.47	22.494.00	0	NE PROCES KONTRAKTIM I
	I TERESISHEM I GJENDJES	3.408.629.80	2.579.785.80	828.844.00		

II. PROJEKTET NE REALIZIM NGA VITI 2017

NR	PROJEKTI	VLERA	VREJTJE	DONATOR	
1	NDERTIMI I SHESHIT				
2	ASFALTIMI I RRUGES STUP - ZAJM FAZA DYTE	408.081.46	NE REALIZIM		
3	ASFALTIMI I RRUGES Qupeve - UJIR	234.927.25	Realizuar 70% realizuar	M.I.	
4	REHABILITIMI I SHTRATIT LUMIT DRINI BARDHE	352.258.00	Realizuar 70%	M.I.	
5	ASFALTIMI I RRUGES LAGIA NGA XHAMIA JASHANICE	289.060.90	Realizuar 60 %	MMPH	
6	ASFALTIMI I RRUGES LAGIA MORINA&BAJRAKTARI	56.906.35	Perfunduar	M.I.	
7	ASFALTIMI I RRUGES LAGIA SLIVOVA-SHPATI	44.547.28	perfunduar	M.I.	
8	ASFALTIMI I RRUGES LAGIA KAMBERA&DOQET	54.345.01	PERFUNDUAR	M.I.	
9	ASFALTIMI I RRUGES LAGIA BULLAKET &HALITAJ	51.419.41	Perfunduar	M.I.	
10	KANALIZIMI NE LAGIEN RUDAJ CARAVIK	39305.51	Perfunduar	M.I.	
11	KANALI PER UJTJE DOLLLOVE	22.753.70	PERFUNDUAR		
12	KANALI PER UJTJE GRABANICE-ZAJM FAZA PARE	9.379.66	Perfunduar		
13	OENDRA RINORE	11.467.46	PRFUNDUAR		
14	ASFALTIMI I RRUGES GIURGIEVIK I MADHE -FAZA DYTE	90.750.00	Stopuar	MKRS	
	TOTALI	26.817.00	Stopuar	M.I.	
		1.714.771.90€			

DATE 31.12.2018 ZYRA E PROKURIMIT
